
















































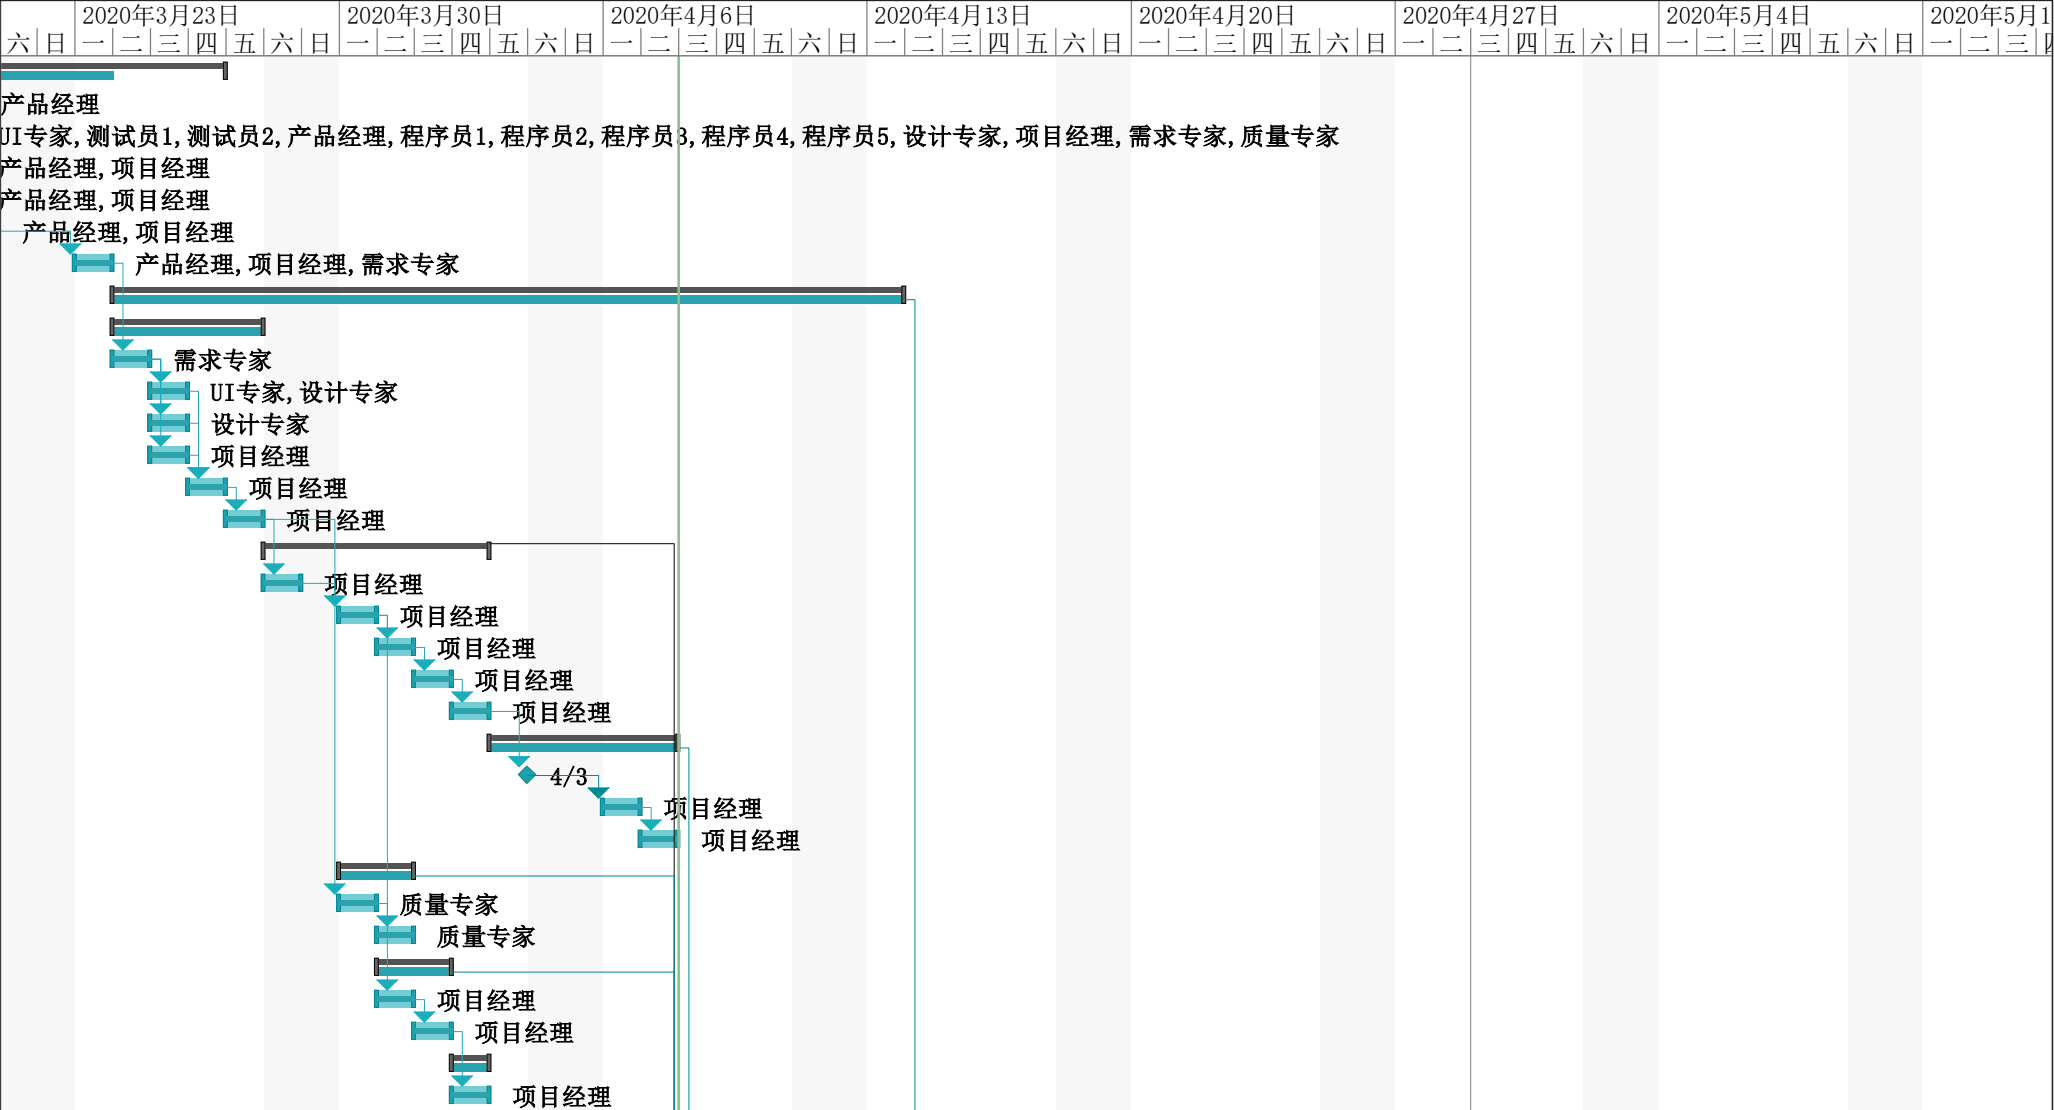










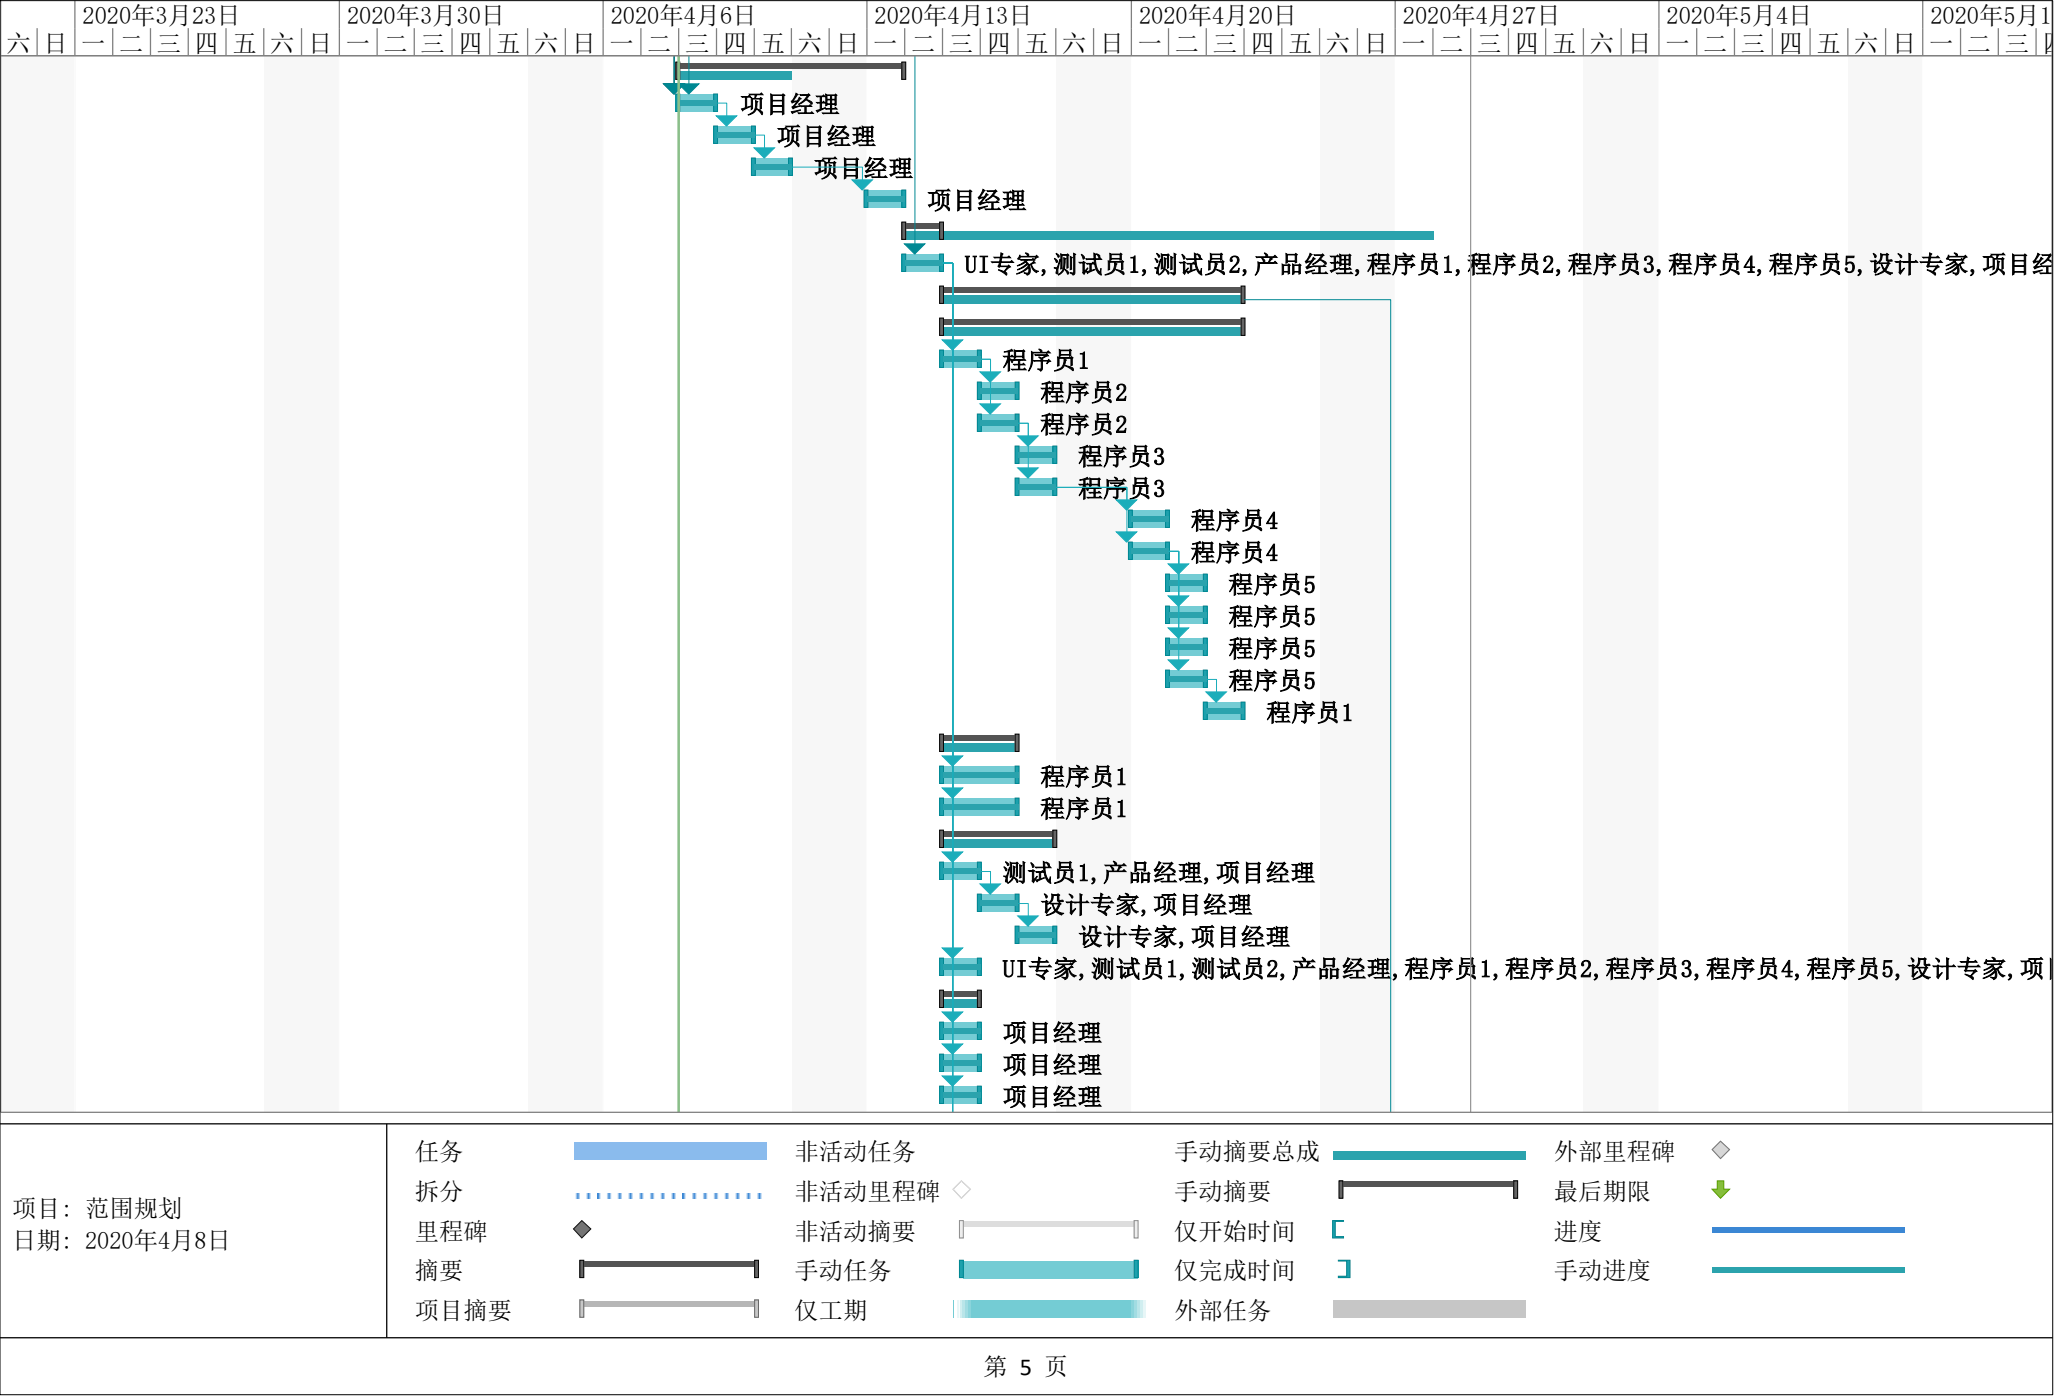
标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日
①									三
1	✓	启动	6 个工作日	2020年3月19	2020年3月26			¥9,320.00	四
2	✓	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理	¥800.00	五
3	✓	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		UI专家, 测试员1, 测试员2,	¥3,800.00	六
4	✓	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理, 项目经理	¥1,120.00	七
5	✓	分析干系人	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理, 项目经理	¥1,120.00	八
6	✓	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月20	2020年3月20	2, 3, 4, 5	产品经理, 项目经理	¥1,120.00	九
7	✓	项目启动大会	1 个工作日	2020年3月23	2020年3月23	6	产品经理, 项目经理, 需求专	¥1,360.00	十
8	✓	规划	15 个工作日	2020年3月24	2020年4月18			¥6,880.00	十一
9	✓	规划范围	4 个工作日	2020年3月24	2020年3月27			¥1,920.00	十二
10	✓	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24	2020年3月24	7	需求专家	¥240.00	十三
11	✓	界面设计	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	UI专家, 设计专家	¥480.00	十四
12	✓	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	设计专家	¥240.00	十五
13	✓	范围说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	项目经理	¥320.00	十六
14	✓	创建WBS	1 个工作日	2020年3月26	2020年3月26	11, 12, 13	项目经理	¥320.00	十七
15	✓	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27	2020年3月27	14	项目经理	¥320.00	十八
16	✓	规划时间	4 个工作日	2020年3月28	2020年4月2			¥1,600.00	十九
17	✓	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年3月28	2020年3月28	15	项目经理	¥320.00	二十
18	✓	估算资源	1 个工作日	2020年3月30	2020年3月30	17	项目经理	¥320.00	二十一
19	✓	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	18	项目经理	¥320.00	二十二
20	✓	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月1	19	项目经理	¥320.00	二十三
21	✓	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2	20	项目经理	¥320.00	二十四
22	✓	规划成本	3 个工作日	2020年4月3	2020年4月7			¥640.00	二十五
23	✓	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3	2020年4月3	21	项目经理	¥0.00	二十六
24	✓	项目预算	1 个工作日	2020年4月6	2020年4月6	23	项目经理	¥320.00	二十七
25	✓	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7	2020年4月7	24	项目经理	¥320.00	二十八
26	✓	规划质量	2 个工作日	2020年3月30	2020年3月31			¥480.00	二十九
27	✓	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30	2020年3月30	15	质量专家	¥240.00	三十
28	✓	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	27	质量专家	¥240.00	三十一
29	✓	规划人力资源	2 个工作日	2020年3月31	2020年4月1			¥640.00	三十二
30	✓	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	18	项目经理	¥320.00	三十三
31	✓	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月1	30	项目经理	¥320.00	三十四
32	✓	规划沟通	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2			¥320.00	三十五
33	✓	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2	31	项目经理	¥320.00	三十六


项目：范围规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			









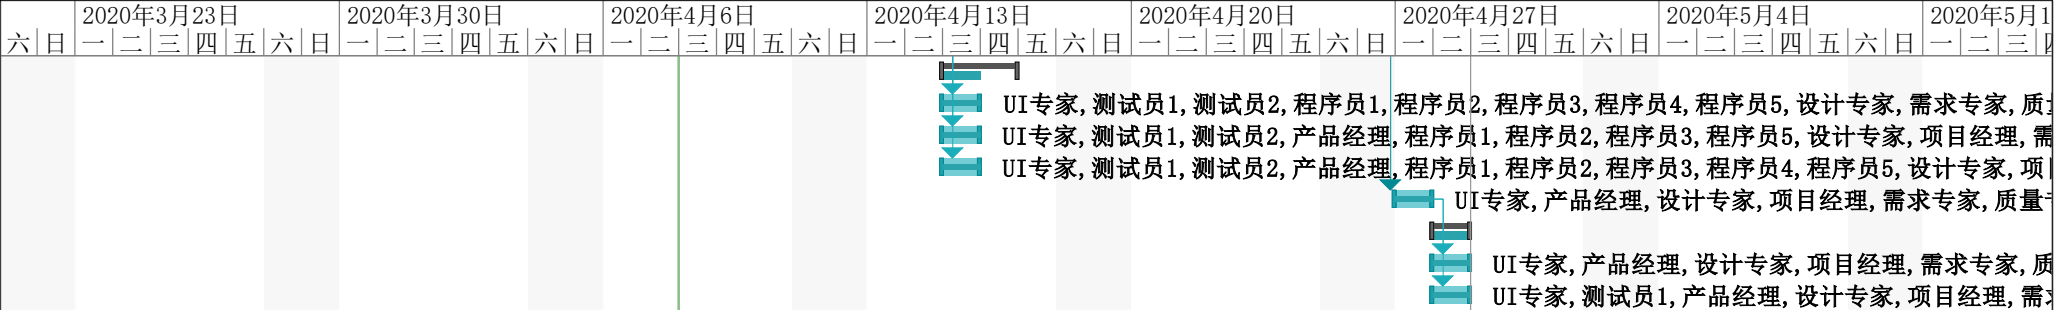









项目：范围规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：范围规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：范围规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	
